

_____ : (04)

ان المشروع هو عبارة عن مجموعة من المعالم أو المراحل أو الأنشطة أو المهام التي تدعم مسعى لإنجاز شيء ما. المشروع هي عملية التخطيط والتنظيم، والمراقبة، والتقييم والقياس.

- في اية مرحلة تدرج عملية تسيير الورشات من مراحل إدارة المشاريع؟ (2)
- (2)

_____ : (4)

- ما هو المشروع؟ (2)
- ما الهدف من عملية إدارة المشاريع؟ (2)


_____ : (4)

تستخدم جدولة المشاريع من قبل المهندسين لضمان المشروع في الوقت المحدد لإيجاد مؤشرات منبهة للحالات الغير اعتيادية حين ظهورها والمرونة في إعادة تخطيط المشروع وفقا لذلك وتشخيصها.

- ماذا يقصد بجدولة المشاريع؟
- ما هي الأنشطة الوهمية؟ هل هي متوقعة؟ اشرحها بمثال

_____ : (08)

مثلت بيانات مشروع معين بطريقة Gantt :

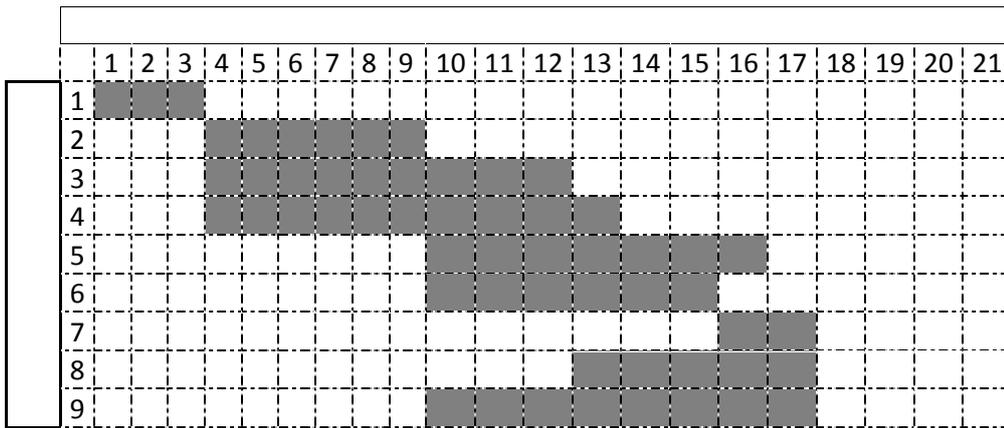

- (02)
- حدد عدد الأنشطة المشكلة للمشروع وزمنها؟ أعط وقت بداية النشاطات 7/6/5 (03)
- ما هو عدد الأنشطة المهمة؟ (02)

توقف النشاط الثالث بداية من الأسبوع الثاني عشر لمدة أسبوع ما هو زمن المشروع الجديد؟ (01)

بالتوفيق.....

